


令和7年度事業、令和8年度事業（予定） 進捗状況（伊吹山3合目～山頂）

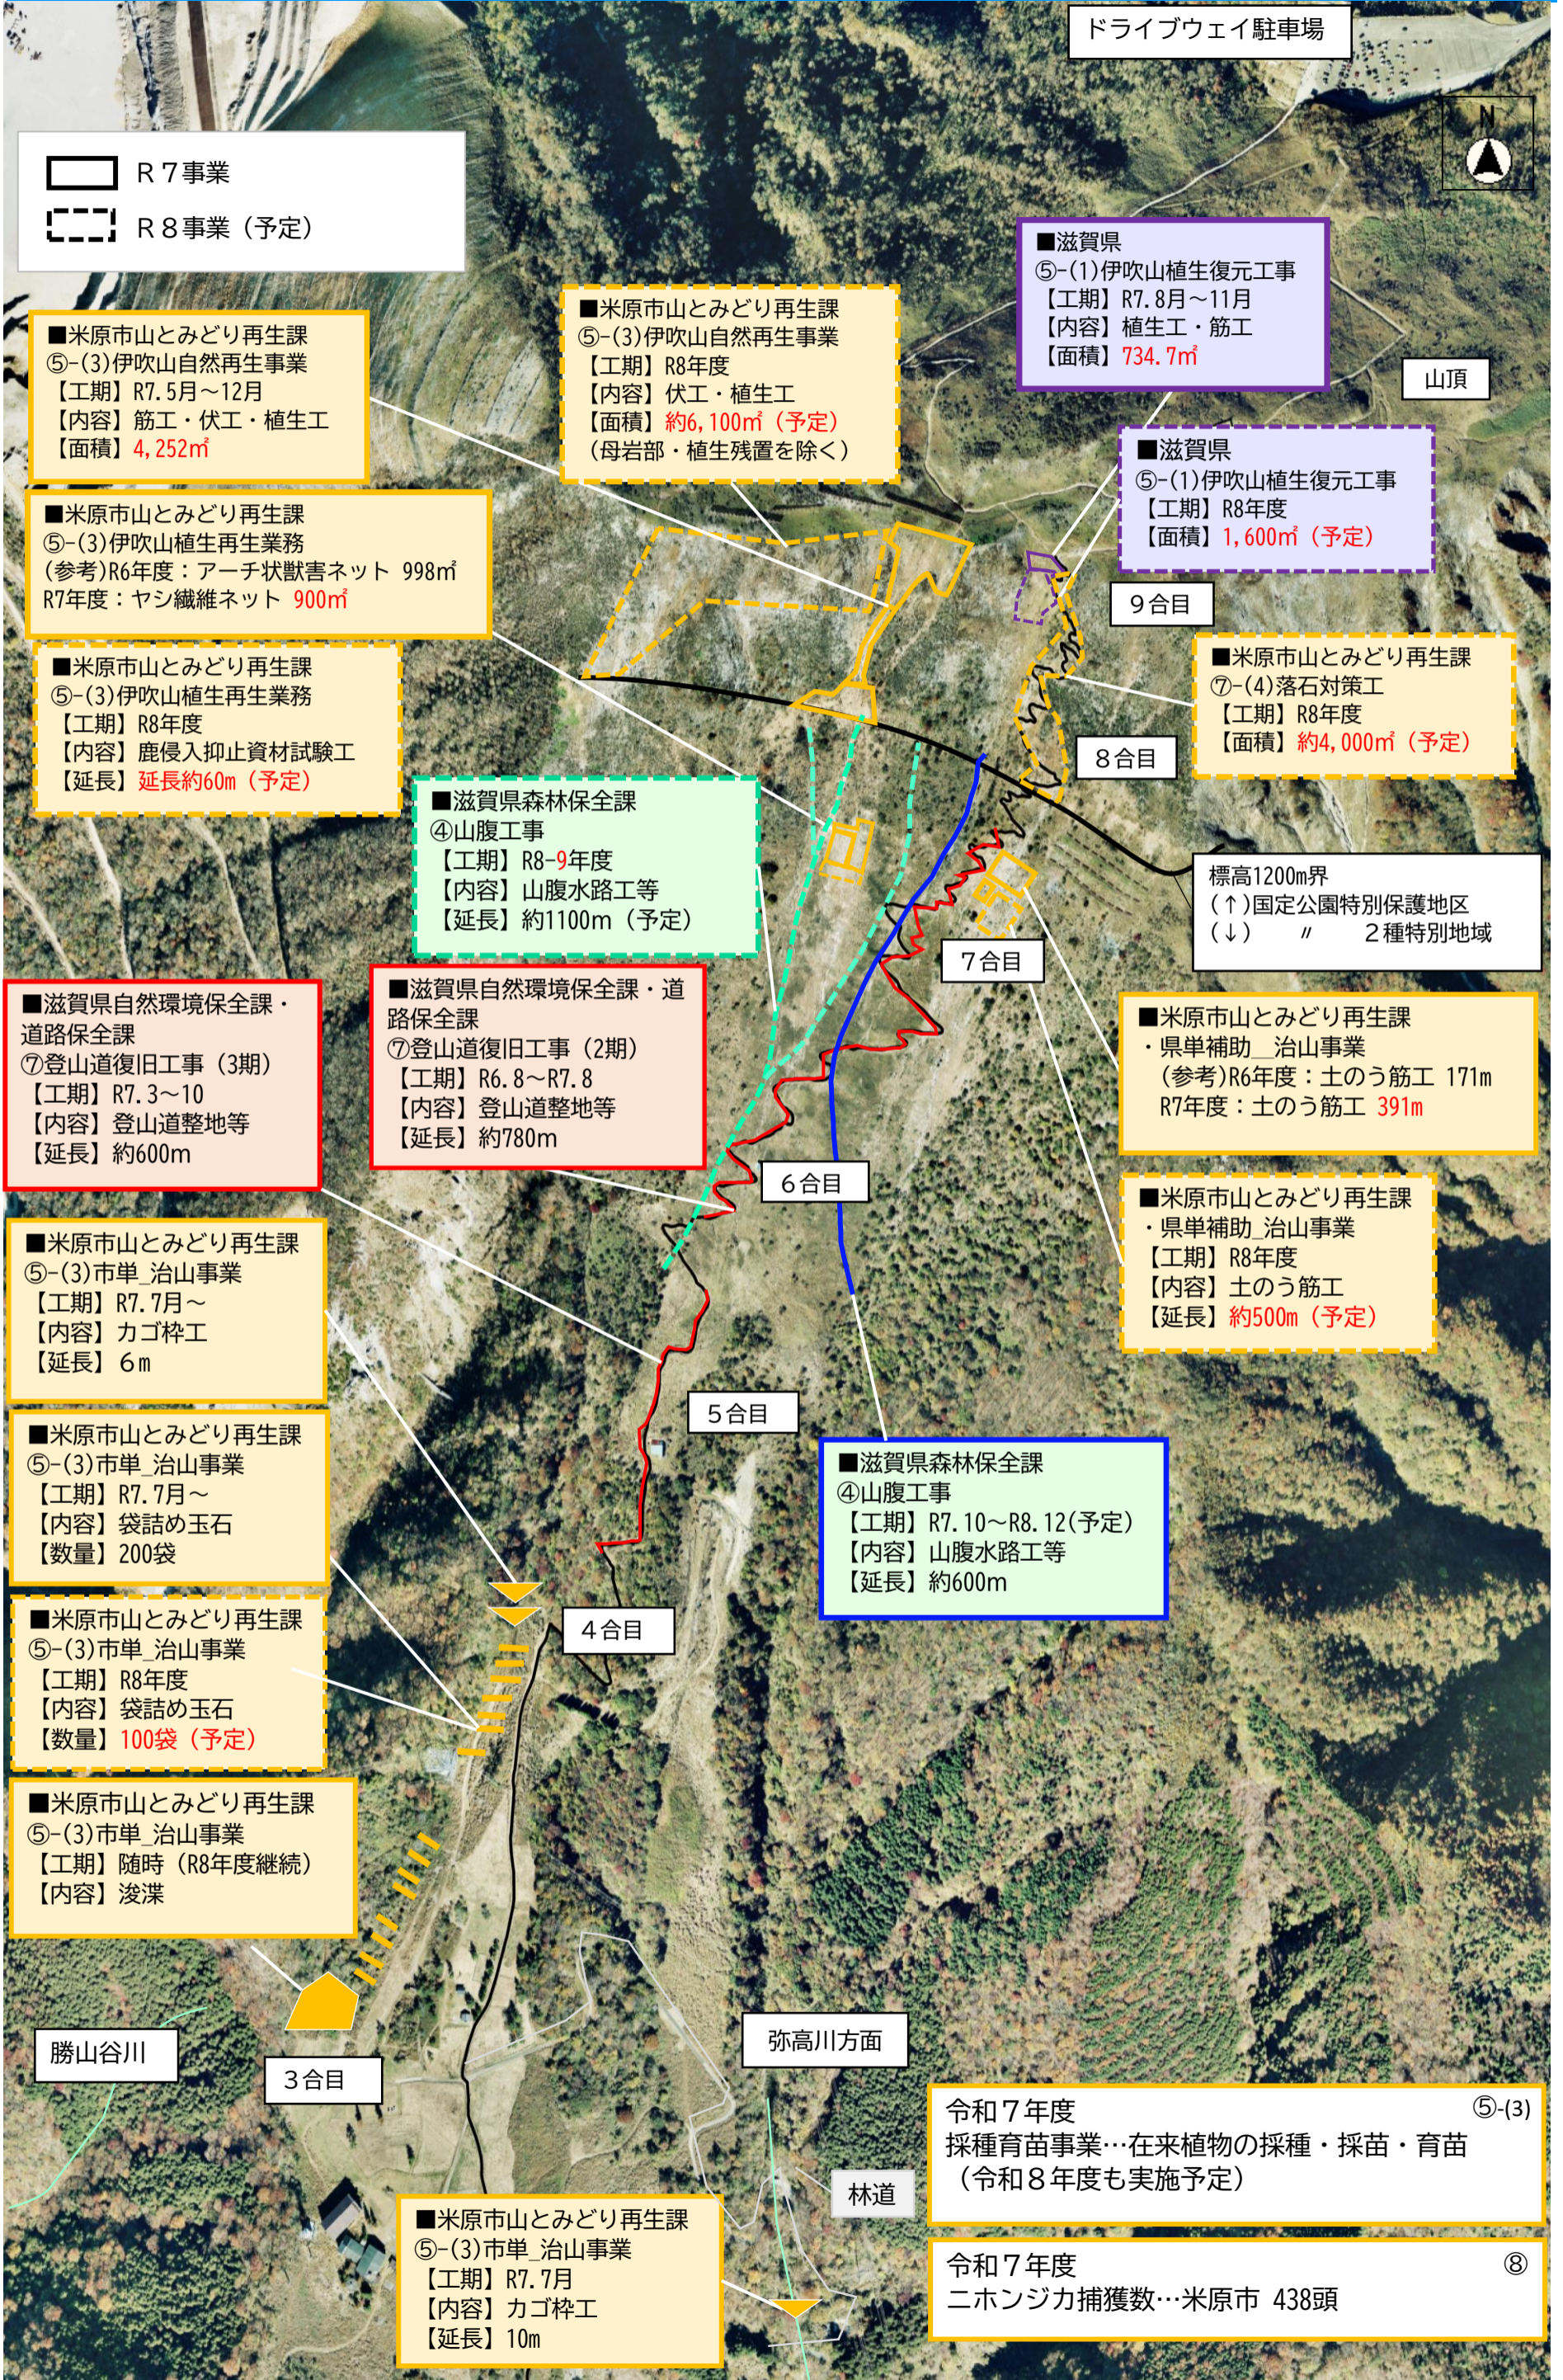

R7事業
 R8事業（予定）

■米原市山とみどり再生課
 ⑤-(3)伊吹山自然再生事業
 【工期】R7.5月～12月
 【内容】筋工・伏工・植生工
 【面積】4,252㎡

■米原市山とみどり再生課
 ⑤-(3)伊吹山自然再生事業
 【工期】R8年度
 【内容】伏工・植生工
 【面積】約6,100㎡（予定）
 （母岩部・植生残置を除く）

■滋賀県
 ⑤-(1)伊吹山植生復元工事
 【工期】R7.8月～11月
 【内容】植生工・筋工
 【面積】734.7㎡

■米原市山とみどり再生課
 ⑤-(3)伊吹山植生再生業務
 （参考）R6年度：アーチ状獣害ネット 998㎡
 R7年度：ヤシ繊維ネット 900㎡

■滋賀県
 ⑤-(1)伊吹山植生復元工事
 【工期】R8年度
 【面積】1,600㎡（予定）

■米原市山とみどり再生課
 ⑤-(3)伊吹山植生再生業務
 【工期】R8年度
 【内容】鹿侵入抑止資材試験工
 【延長】延長約60m（予定）

■米原市山とみどり再生課
 ⑦-(4)落石対策工
 【工期】R8年度
 【面積】約4,000㎡（予定）

■滋賀県森林保全課
 ④山腹工事
 【工期】R8-9年度
 【内容】山腹水路工等
 【延長】約1100m（予定）

標高1200m界
 （↑）国定公園特別保護地区
 （↓）" 2種特別地域

■滋賀県自然環境保全課・道路保全課
 ⑦登山道復旧工事（3期）
 【工期】R7.3～10
 【内容】登山道整地等
 【延長】約600m

■滋賀県自然環境保全課・道路保全課
 ⑦登山道復旧工事（2期）
 【工期】R6.8～R7.8
 【内容】登山道整地等
 【延長】約780m

■米原市山とみどり再生課
 ・県単補助_治山事業
 （参考）R6年度：土のう筋工 171m
 R7年度：土のう筋工 391m

■米原市山とみどり再生課
 ⑤-(3)市単_治山事業
 【工期】R7.7月～
 【内容】カゴ砕工
 【延長】6m

■米原市山とみどり再生課
 ・県単補助_治山事業
 【工期】R8年度
 【内容】土のう筋工
 【延長】約500m（予定）

■米原市山とみどり再生課
 ⑤-(3)市単_治山事業
 【工期】R7.7月～
 【内容】袋詰め玉石
 【数量】200袋

■滋賀県森林保全課
 ④山腹工事
 【工期】R7.10～R8.12(予定)
 【内容】山腹水路工等
 【延長】約600m

■米原市山とみどり再生課
 ⑤-(3)市単_治山事業
 【工期】R8年度
 【内容】袋詰め玉石
 【数量】100袋（予定）

■米原市山とみどり再生課
 ⑤-(3)市単_治山事業
 【工期】随時（R8年度継続）
 【内容】浚渫

勝山谷川

弥高川方面

林道

令和7年度
 採種育苗事業…在来植物の採種・採苗・育苗
 （令和8年度も実施予定）

令和7年度
 ニホンジカ捕獲数…米原市 438頭

■米原市山とみどり再生課
 ⑤-(3)市単_治山事業
 【工期】R7.7月
 【内容】カゴ砕工
 【延長】10m
